

**Észak-dunántúli Területi
Vízgazdálkodási Tanács Titkársága**

9021 Győr, Árpád út 28-32.

Levélcím: 9002 Győr, Pf.: 101.

Telefon: (36) (96) 500-000

Telefax: (36) (96) 315-342

Internet-cím: <http://www.edukovizig.hu/> MÁK: 100 33001-01712027

Győr-Moson-Sopron Megyei Albizottsági Ülés

2010. április 27.

3. napirendi pont

Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása

Igazgatóságunk a KEOP -2.1.1/1f-2008-0012 azonosító számú Marcal jobb parti árvízvédelmi biztonságának javítása című projektre 2008 októberében kötött támogatási szerződést a KVVMM Fejlesztési Igazgatósággal.

Ez alapján elkezdődhetnek a projekt előkészítési munkái. Az elmúlt időszakban lezajlottak a közbeszerzések, amely alapján a nyertes Ajánlattevő (SOLVEX Kft.) megkezdte az érdemi tervezési feladatokat.

Jelenleg az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése van folyamatban, a későbbiekben ezt vállalkozónak tenderterv szinten kell kidolgoznia. A vállalkozó feladata a második forduló pályázat benyújtásához szükséges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) elkészítése is, továbbá a projekt megvalósításához szükséges egyéb vizsgálatok lefolytatása (pl. régészeti szakvélemény, stb.) Az előkészítő munkák befejezési határideje 2010 november, ezt követően kerül sor a második forduló pályázat benyújtására a megvalósítási munkák finanszírozásához.

A projekt keretében a Marcal jobb parti, valamint a sokoróaljai Bakony-ér jobb és bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltései az előírások szerinti biztonságra kiépítésre kerülnek, megfelelő magasparti bekötés mellett. Ez több mint 9 km-nyi töltéshossz fejlesztését követeli meg. A védvonalak hossz mentén történő járhatóságát meg kell oldani, hogy árvízkor a védekezésben részt vevő járművek megfelelően tudjanak közlekedni a védvonalon. A Bakonyér-menti töltéskorona szélesítésre kerül, és a töltésszakaszok közti magasparti részeken biztosítottá válik az átjárási lehetőség.


A tervezési munkák során felülvizsgálják a védvonal műtárgyainak jelenlegi és távlati funkcióit. Ennek megfelelően történik a műtárgyak felújítása, átépítése illetőleg bontása.

Átépítéssel érintett a Holt-Marcal beeresztő zsilip és a Marcal duzzasztó árapasztó műtárgya is. Koroncó község belterületén lévő és a település vízlevezetéséhez szükséges zsilipek mellett szivattyúzási helyek lesznek kialakítva.

Felújításra kerülnek a védvonalon található gátörtelepek is.

A beruházás keretében a tulajdonviszonyok rendezését is megtörténik, a fejlesztéshez szükséges nem állami területek állami tulajdonba kerülnek.

Az előkészítő munkák költsége 208,3 millió Ft. A beruházás teljes költsége várhatóan 4,2 milliárd Forint.

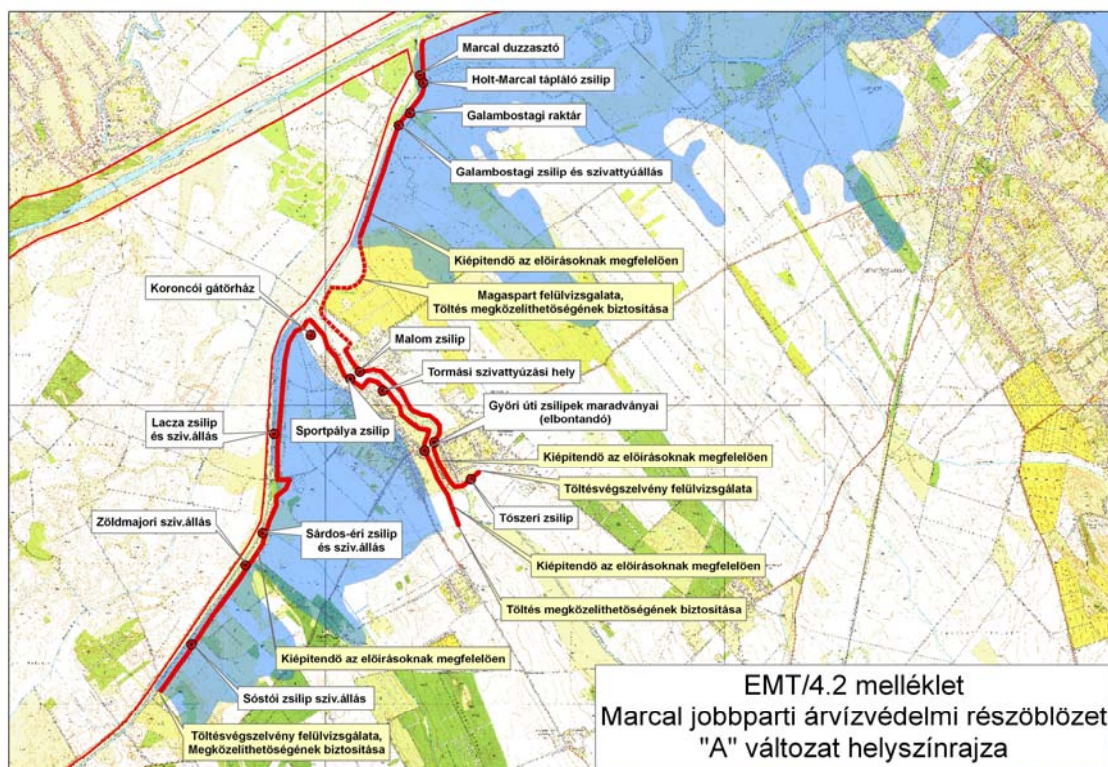

Győr, 2010. április. 21.

Készítette:

Dunai Ferenc – Vásárhelyi Péter
ÉDUKÖVIZIG
 Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztály
